| | BU FONDATIONS SPECIALES | SGTM FONDATIONS SPECIALES |
|---|---|---|

# Check liste : Groupe Électrogène

Marque : PECASUS Numéro : .....

Nom du vérificateur : Mohamed Taifi

| N° | الاثنين | | الثلاثاء | | الأربعاء | | الخميس | | الجمعة | | السبت | | Avant le démarrage قبل التشغيل الآلية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Symbole de danger |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | État général de groupe électrogène |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Emplacement de groupe électrogène (stabilité, espace disponible...) |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Mise à la terre |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Bac de rétention |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Câble (s) protégé par gaine |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Etanchéité |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Interrupteur |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Disjoncteur |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Arrêt d'urgence |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Plastron de prises |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Bornier de raccordement |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Porte accès à la maintenance, contrôle commande... |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Cofiret de commande |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Absence de fuite |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | Extincteur |

Observations :

| Nom et Visa | Lundi 9/3/26 | Mardi 10/3/26 | Mercredi 11/3/26 | Jeudi 12/3/26 | Vendredi 13/3/26 | Samedi 14/3/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducteur (Vérificateur) | | | | | | |
| Chef d'équipe | | | | | | |
| HSE | HSE | HSE | HSE | HSE | HSE | HSE |

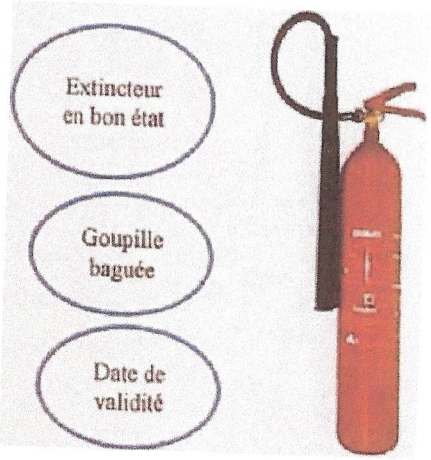


**En cas de problème des points de la check-list, contacter votre hiérarchie avant l'utilisation de l'engin !**

في حالة وجود أي مشكلة في القائمة، إتصل بالمسؤولين قبل إستخدام الآلية
